



DÍLČÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY pokládka živice 23.-27.6.2014

Název stavby:		Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I.etapa			
Číslo stavby:		1517.202 4046 LLO	Verze: ---	16.6.2014	
Investor (objednatel):		Krajská správa silnic Libereckého kraje		Rok	2014
Projektant (zpracovatel):		Valbek, spol. s r.o.		Měsíc	6
Zhotovitel stavby:		Sdružení Eurovia CS - INTEGRA		Týden	26
				Den	23 24 25 26 27 28 29 30

úsek	název úseku	Poznámka	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Kryštofovo Údolí - Hamrštejn (SO 222 - SO 220)	úplná uzavírka od 8:00 - 16:00								
2	konec Nová Ves - garáž u Traktorky (p. Haki) (SO 231 - SO 230)	pod úplnou uzavírkou (Strabag - II. etapa)								
3	garáž u Traktorky (p.Haki) - most u Textilány (SO 229 - SO 204)	pod úplnou uzavírkou (Strabag - II. etapa)								
4	most u Textilány - most u ul. Družstevní (SO 204 - SO 203)	úplná uzavírka od 8:00 - 16:00								
5	ul. Nádražní OK - kř. Andělohorská (SO 101.3)	úplná uzavírka od 8:00 - 16:00								

!!!Termíny pokládky se mohou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti (počasí, logistika) posunout o +1 den!!!

rezerva

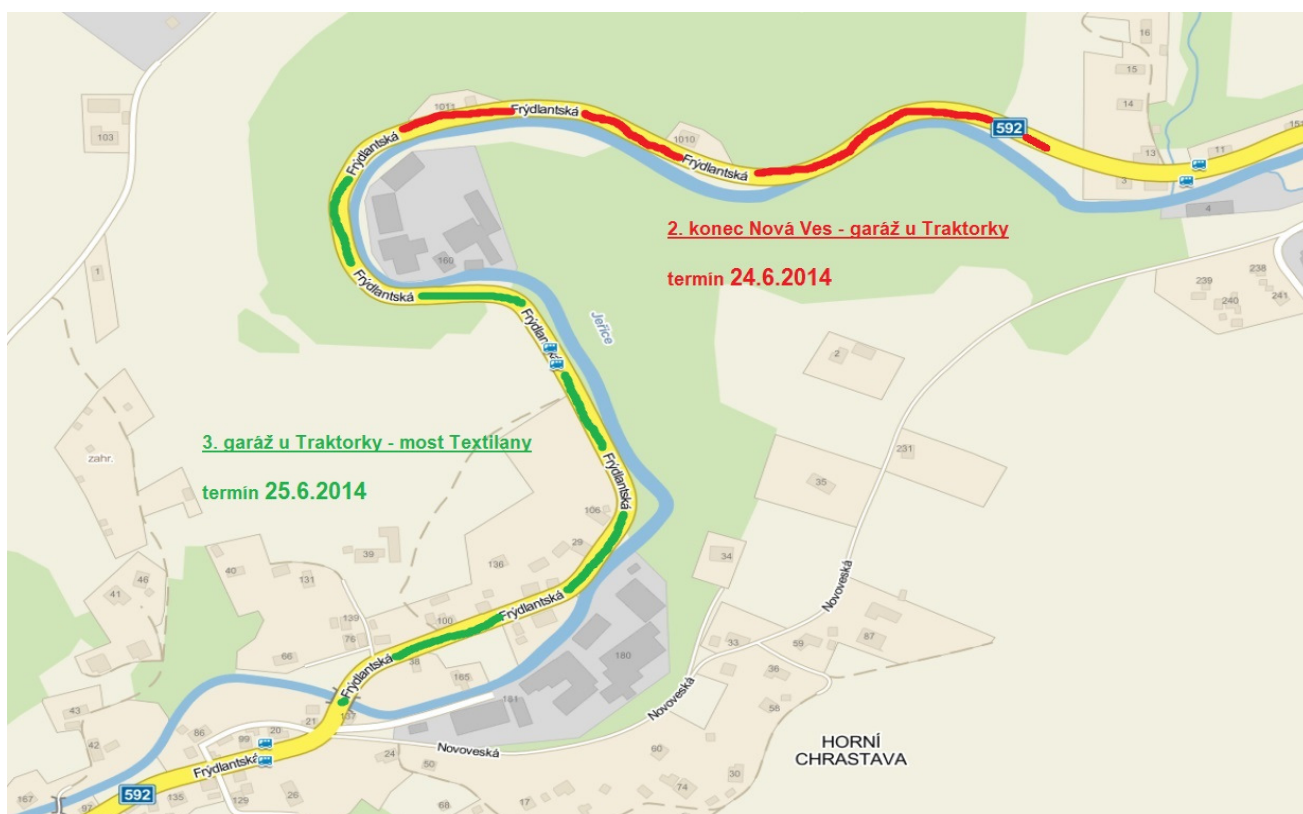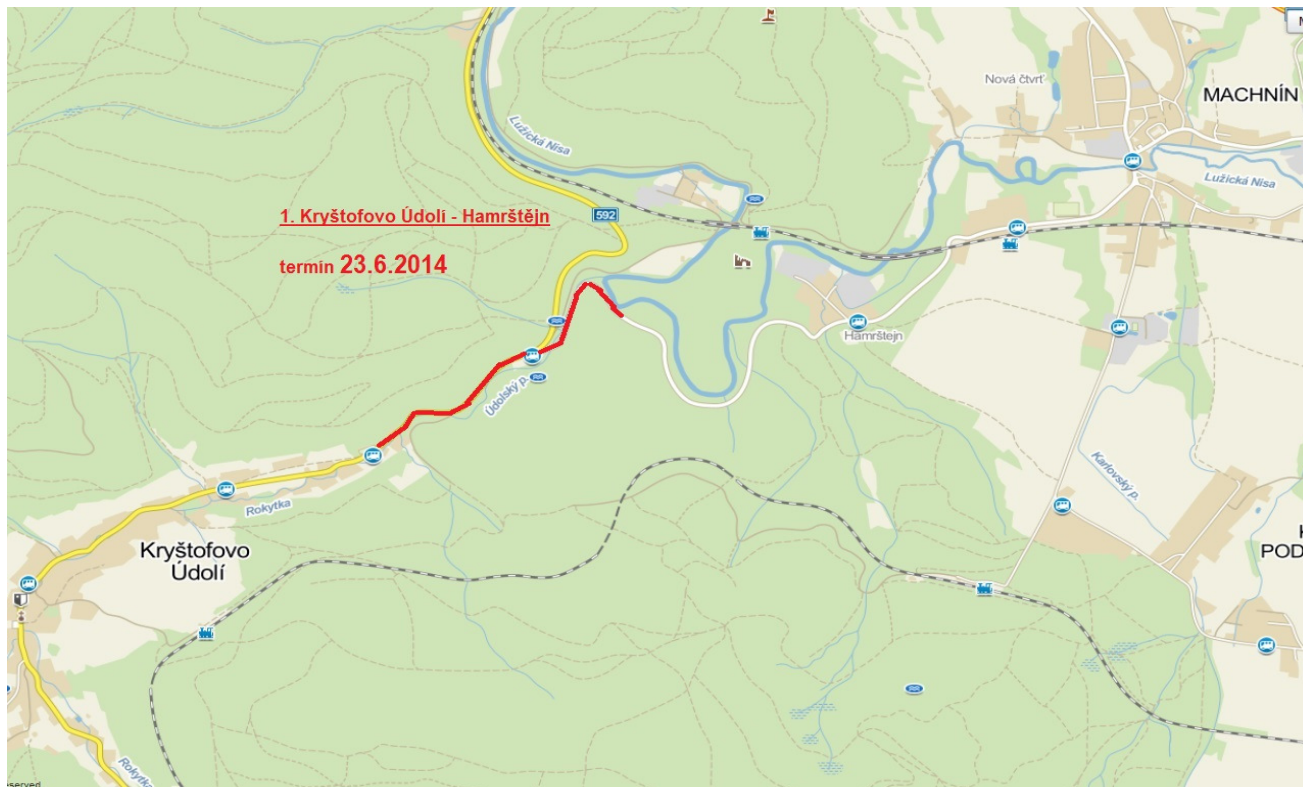



za Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra
ing. Ladislav Lorenc

16. květen 2014
